

## Информация

Форма 21

Приложение №5

к Правилам утверждения инвестиционных программ(проектов) субъекта естественной монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

субъекта естественной монополии

об исполнении инвестиционной программы  
за 1 полугодие за 2026 г.

Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"

(наименование субъекта)

Передача, распределение и реализация электроэнергии

(вид деятельности)

Приложение №5 приказу руководителя Департамент Комитета

по регулированию естественных монополий

Министерства национальной экономики Республики Казахстан

по области Жетісу от "26" марта 2026 года №16-ОД, согласованный Руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства от "30" марта 2026 года № 48-ОД

(кем утверждена программа проекта, (дата, номер приказа))

| № П/П | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ), |                                                                                                               |                   |                                                    |       |                                                                          | Отчет о прибылях и убытках* тыс.тг | Сумма инвестиционной программы (проекта) |            |               |                    | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тг |         |                  |                    | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) |                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                         |      |                                                                                                               | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности и предоставления регулируемых услуг и эффективности деятельности                                                             |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория                     | Наименование мероприятий                                                                                      | Единица измерения | Количество в натуральных показателях, тыс. кВт/час |       | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |                                    | План                                     | Факт       | отклонение    | Причины отклонения | собственные средства                                                                                   |         | Заемные средства | Бюджетные средства | Детальность, не относящаяся к регулируемым услугам                                                                                                                  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |                    | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |      | Снижение аварийности, шт по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                    |
|       |                                                                                                 |                                                                                                               |                   | План                                               | Факт  |                                                                          |                                    |                                          |            |               |                    | Амортизация                                                                                            | Прибыль |                  |                    |                                                                                                                                                                     | факт прошлого года                                                                                                                               | факт текущего года | план                                                                                                    | факт | факт прошлого года                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     | факт текущего года |
| 1     | 2                                                                                               | 3                                                                                                             | 4                 | 5                                                  | 6     | 7                                                                        | 8                                  | 9                                        | 10         | 11            | 12                 | 13                                                                                                     | 14      | 15               | 16                 | 19                                                                                                                                                                  | 20                                                                                                                                               | 21                 | 22                                                                                                      | 23   | 24                                                                                                            | 25                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                    |
| 1     | Передача, распределения и реализация электроэнергии                                             | Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК"                             | км                | 84.21                                              | 29.18 | 01.01.26-30.06.26 г                                                      | 0                                  | 1 950 000.00                             | 557 223.9  | -1 392 776.11 |                    | 557 223.89                                                                                             | 0.00    | 0.00             | 0.00               | 82.7%                                                                                                                                                               | 78.5%                                                                                                                                            | 15.5%              | 12.7%                                                                                                   | 349  | 211                                                                                                           |                                                                                                                                    | На оценку повышения качества и надежности и АО "ТАТЭК" влияют показатели потерь и аварийности за отчетный период отмечена положительная динамика данных показателей |                    |
| 1     |                                                                                                 | Модернизация распределительных сетей ВЛ-6/0,4 кВ №67-07 г. Текели область Жетісу                              | км                | 10.90                                              | 3.86  |                                                                          |                                    | 553 640.62                               | 52 941.55  | -             | 500 699            | 52 941.55                                                                                              |         |                  |                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                         |      |                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                    |
| 2     |                                                                                                 | Модернизация распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ №68-02 г. Текели область Жетісу                                | км                | 13.90                                              | 3.23  |                                                                          |                                    | 476 229.48                               | 47 008.80  | -             | 429 221            | 47 008.80                                                                                              |         |                  |                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                         |      |                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                    |
| 3     |                                                                                                 | Модернизация распределительных сетей ВЛ-6/0,4 кВ №68-05 г. Текели область Жетісу                              | км                | 6.90                                               | 2.19  |                                                                          |                                    | 132 376.74                               | 53 018.76  | -             | 79 358             | 53 018.76                                                                                              |         |                  |                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                         |      |                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                    |
| 4     |                                                                                                 | Модернизация сетей электроснабжения ЛЭП-35 №33 Екіаша-Теректі Сарканский район область Жетісу                 | км                | 18.80                                              | 4.65  |                                                                          |                                    | 201 948.61                               | 80 710.50  | -             | 121 238            | 80 710.50                                                                                              |         |                  |                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                         |      |                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                    |
| 5     |                                                                                                 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10/0,4 кВ №42 от ПС-134г. Жаркент Панфиловский р/н. область Жетісу    | км                | 17.04                                              | 8.894 |                                                                          |                                    | 170 580.10                               | 179 921.54 |               | 9 341              | 179 921.54                                                                                             |         |                  |                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                         |      |                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                    |
| 6     |                                                                                                 | Модернизация распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ №44 от ПС-134 г. Жаркент Панфиловский район, область Жетісу | км                | 16.67                                              | 6.35  |                                                                          |                                    | 415 224.45                               | 143 622.74 | -             | 271 602            | 143 622.74                                                                                             |         |                  |                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                         |      |                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                    |

Управляющий директор  
по производству

Управляющий директор  
по экономике и финансам

Туганбаев А.Б.

Адамбекова Г.Е.

| Показатели эффективности, надежности и качества                                                                                             | факт года, предшествующего отчетному периоду | план (год)<br>тыс.тг | факт текущего года | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)             | 100%                                         | 1 950 000            | 28.6%              | -71.4%                                                             |                                                                                     |
| Снижение износа(физического)основных фондов(активов), %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта) | 82.7%                                        |                      | 78.5%              | -4.2%                                                              |                                                                                     |
| Снижение потерь,%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)                                       | 15.50%                                       |                      | 12.70%             | -2.8%                                                              |                                                                                     |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)(шт)                              | 349                                          |                      | 211                | -138.0                                                             |                                                                                     |


Управляющий директор по производству

Туганбаев А.Б.



# Модернизация распределительных сетей ВЛ-6/0,4кВ №6707 г.Текели, область Жетісу

## До модернизации

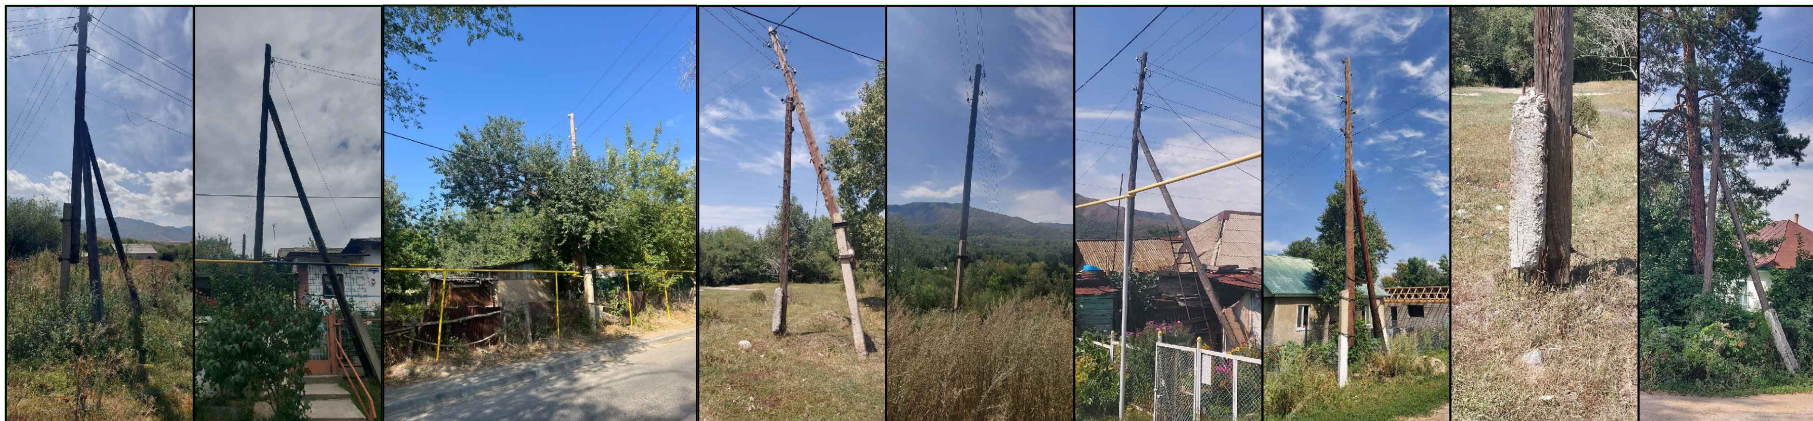


Настоящим проектом предусмотрено замена существующей воздушной линии ВЛ-6/0,4кВ №6707 г.Текели, область Жетісу

Проектом предусмотрена замена воздушной линии ВЛ-10кВ с неизолированными проводами на ВЛЗ-10кВ с защищенными проводами марки СИП-3 с сечением провода 1х50мм<sup>2</sup>. Также проектом предусмотрена замена воздушной линии ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ с изолированными проводами марки СИП-4 с сечением проводов 4х50мм<sup>2</sup>, 4х70мм<sup>2</sup> с применением арматуры ENSTO. а так же замена морально и технологический устаревших ТП-10/0,4кВ на КТПН-10/0,4кВ современного/ компактного/ закрытого типа наружной установки. Воздушная линия 0,4кВ №6707 введена в эксплуатацию в **1960 году**. Износ составляет **100%**

Существующая линия ВЛ-10/0,4кВ выполнена на деревянных опорах с неизолированным проводом марки Ас/А. По окончания работ по модернизации распределительных сетей, действующая линия ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ на деревянных опорах с неизолированным проводом АС/А подлежит демонтажу.

## Ход модернизации

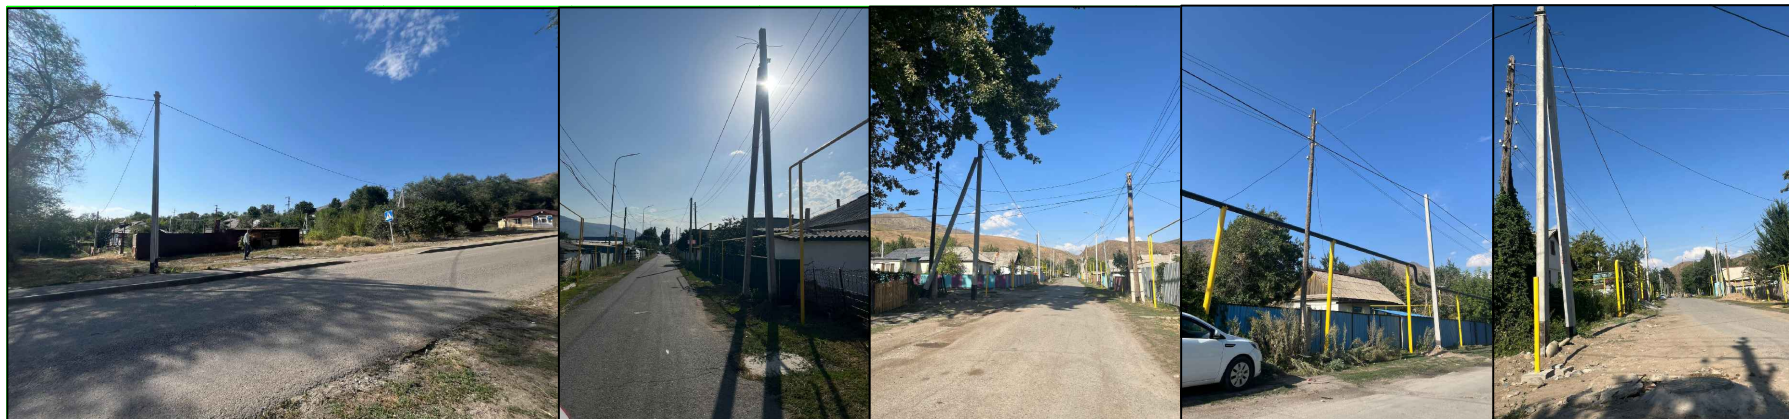

# Модернизация распределительных сетей ВЛ-0,4кВ №6802 г.Текели, область Жетісу

## До модернизации



Настоящим проектом предусмотрено замена существующей воздушной линии ВЛ-0,4кВ №6802 г.Текели, область Жетісу. Проектом предусмотрено замена воздушной линии ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ с изолированными проводниками марки СИП-4 с сечением проводов 4х50мм<sup>2</sup>, 4х70мм<sup>2</sup> с применением арматуры ENSTO. а так же замена морально и технологически устаревших ТП-10/0,4кВ на КТПН-10/0,4кВ современного/ компактного/ закрытого типа наружной установки. Воздушная линия 0,4кВ №6802, введена в эксплуатацию в **1960 году**. Износ составляет **100%**

Существующая линия ВЛ-10/0,4кВ выполнена на деревянных опорах с неизолированным проводом марки Ас/А. По окончании работ по модернизации распределительных сетей действующая линия ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ на деревянных опорах с неизолированным проводом АС/А подлежит демонтажу.

## Ход модернизации



# Модернизация распределительных сетей ВЛ-6/0,4кВ №6805 г.Текели, область Жетісу

## До модернизации



Настоящим проектом предусмотрено замена существующей воздушной линии ВЛ-6/0,4кВ №6805 г.Текели, область Жетісу.

Проектом предусмотрена замена воздушной линии ВЛ-10кВ с неизолированными проводами на ВЛЗ-10кВ с защищенными проводами марки СИП-3 с сечением провода 1х50мм<sup>2</sup>. Также проектом предусмотрена замена воздушной линии ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ с изолированными проводами марки СИП-4 с сечением проводов 4х50мм<sup>2</sup>, 4х70мм<sup>2</sup>, с применением арматуры ENSTO. а так же замена морально и технологический устаревших ТП-10/0,4кВ на КТПН-10/0,4кВ современного/ компактного/ закрытого типа наружной установки. Воздушная линия 0,4кВ №6805 введена в эксплуатацию в **1961 году**. Износ составляет **100%**

Существующая линия ВЛ-10/0,4кВ выполнена на деревянных опорах с неизолированным проводом марки Ас/А. По окончании работ по модернизации распределительных сетей, действующая линия ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ на деревянных опорах с неизолированным проводом АС/А подлежит демонтажу.

## Ход модернизации



# Модернизация распределительных сетей ВЛ-10/0,4кВ №42 от ПС-134 г.Жаркент, Панфиловского района, область Жетісу

До модернизации



Настоящим проектом предусмотрено замена существующей воздушной линии ВЛ-10/0,4кВ №42 от ПС-134 г.Жаркент.

Проектом предусмотрена замена воздушной линии ВЛ-10кВ с неизолированными проводами на ВЛЗ-10кВ с защищенными проводами марки СИП-3 с сечением провода 1х50мм<sup>2</sup>. Также проектом предусмотрена замена воздушной линии ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ с изолированными проводами марки СИП-4 с сечением проводов 4х35мм<sup>2</sup>, 4х50мм<sup>2</sup>, 4х70мм<sup>2</sup> с применением арматуры ENSTO. а так же замена морально и технологически устаревших ТП-10/0,4кВ на КТПН-10/0,4кВ современного/ компактного/ закрытого типа наружной установки. Воздушная линия 0,4кВ №42 от ПС-134 введена в эксплуатацию в **1967 году**. Износ составляет **100%**

Существующая линия ВЛ-10/0,4кВ выполнена на деревянных опорах с неизолированным проводом марки Ас/А. По окончании работ по модернизации распределительных сетей, действующая линия ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ на деревянных опорах с неизолированным проводом АС/А подлежит демонтажу.

Ход модернизации



# Модернизация распределительных сетей ВЛ-10/0,4кВ №44 от ПС-134 г.Жаркент, Панфиловского района, область Жетісу

До модернизации



Настоящим проектом предусмотрено замена существующей воздушной линии ВЛ-10/0,4кВ №44 от ПС-134 в городе Жаркент .

Проектом предусмотрена замена воздушной линии ВЛ-10кВ с неизолированными проводами на ВЛЗ-10кВ с защищенными проводами марки СИП-3 с сечением провода 1х50мм<sup>2</sup>. Также проектом предусмотрена замена воздушной линии ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ с изолированными проводами марки СИП-4 с сечением проводов 4х35мм<sup>2</sup>, 4х50мм<sup>2</sup>, 4х70мм<sup>2</sup> с применением арматуры ENSTO. а так же замена морально и технологический устаревших ТП-10/0,4кВ на КТПН-10/0,4кВ современного/ компактного/ закрытого типа наружной установки. Воздушная линия 0,4кВ №44 от ПС-134 введена в эксплуатацию в **1992 году**. Износ составляет **100%**

Существующая линия ВЛ-10/0,4кВ выполнена на деревянных опорах с неизолированным проводом марки Ас/А. По окончании работ по модернизации распределительных сетей, действующая линия ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ на деревянных опорах с неизолированным проводом АС/А подлежит демонтажу.

Ход модернизации



# Модернизация сетей электроснабжения ЛЭП-35кВ №33 Екіаша-Теректі Сарканского района, область Жетісу

## До модернизации



Настоящим проектом предусмотрено замена существующей воздушной линии ЛЭП-35кВ №33 Екіаша-Теректі Сарканского района.

1. **Существующее состояние:** ВЛ-35 кВ №33 введена в эксплуатацию в 1974 году, срок службы линии превышает 50 лет. Общая протяженность существующей трассы составляет 18,8 км. Участок длиной 7,024 км выполнен на железобетонных стойках марки СВ164, остальная часть -- на деревянных опорах. В качестве токоведущего элемента используется провод АС 50/11 мм<sup>2</sup>. По результатам обследования установлено значительное физическое и моральное устаревание конструктивных элементов линии

2. **Намеченные мероприятия:** В целях модернизации электрических сетей ЛЭП-35кВ №33 Екіаша-Теректі необходимо выполнить следующие работы:

Согласно акту технического обследования разработать рабочий проект по модернизации ВЛ-35 кВ №33.

- выполнить полную замену подвешенного провода АС50/11 мм<sup>2</sup> на АС70/11 мм<sup>2</sup>;
- на участке с ж/б опорами марки СВ164 замена подвесной арматуры и линейной арматуры ЛЭП-35кВ;
- на участке с деревянными опорами полная модернизация линии 35кВ, включая замену деревянных опор на ж/б опоры марки СВ164.

Произвести изменение трассы ЛЭП-35кВ, вынос ЛЭП с территории посевных полей и частных территории на вдоль автомобильной дороги. Данная мероприятие направлена на более эффективное обслуживание, ускоренное восстановление при аварийных отключении, доступ к ЛЭП в любое время года, облегчение визуального осмотра.

## До модернизации

